

ROMANIA  
 Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc  
 JUDETUL HARGHITA  
 4245763

Data emiterii: 29.10.2020 Nr.: 3104  
 Compartimentul de specialitate:  
 Directia Generala Tehnica  
 Inregistrare: 17601 / 10.08.2020

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

**Explicatie:** PLATĂ SITUATIE DE LUCRĂRI NR. 2 REABILITARE DJ153D KM 1+000 - 4+500

**Beneficiar:** MULTIPLAND SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)		Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat		
	Cap. Subcap.	Centr. Bugetar			Titlu	Art. Alin.	valuta		suma lei	
							felul			suma
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	0	4	5	6	7	8	
				3 = col.1-2					8 = col.3-7	
				6.167.363,07		0,00		284.249,33	5.883.113,74	

**Total: 284.249,33**

Compartimentul de specialitate

Serviciul contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura  
 Numele  
 Data  
 Data: Semnatul

Bun de plata

Semnatura

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	284.249,33
<b>Total:</b>				<b>284.249,33</b>

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data: 20.10.2020

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATĂ SITUA?IE DE LUCRĂRI NR. 2 REABILITARE DJ153D KM 1+000 - 4+500

**Lista documentelor justificative:**

Nr.Fact. 1187/31.07.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 21653 / 23.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 284.249,33  
Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00  
Suma de plata: 284.249,33

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 284.249,33

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.			
0				1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	35.284.999,09	284.249,33	35.000.749,76

**Beneficiar:**

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiului Miercurea Ciuc

Certificat in privința

Completarea regulilor de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Numele ..  
Data ..  
Semnatura

semnatura:

iza, Semnatura:

Data: 29.10.2020

Data:

ata:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

**FACTURA**

NR inreg CJH. 17601/10.08.2020

Serie MUL Numar 1187

Data 31.07.2020 Scadent la 31.08.2020



- RON -

Furnizor

Client

**S.C. MULTIPLAND SRL****JUDETUL HARGHITA**

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 153D SECTOR KM 1+000 - 4+500". CTR. NR. 92/ 21653/ 23.09.2019		1.000	238 864.98	238 864.98	45 384.35
Date privind expeditia Numele delegatului: C.I. seria: nr: eliberat de: Mijlocul de transport:					238 864.98	45 384.35
<b>Total</b>					<b>284 249.33</b>	



Referatul dirigintelui de santier

Obiect ;

**Reabilitare sistem rutier pe DJ 153D, sector km 1+000 - 4+500**

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. MULTIPLAND SRL

Subiect; Lucrarile executate in perioada iulie 2020


La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie

- situatia de lucrari nr, 2 in valoare de – **238.864,98 lei** fara TVA

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .  
S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucrarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier

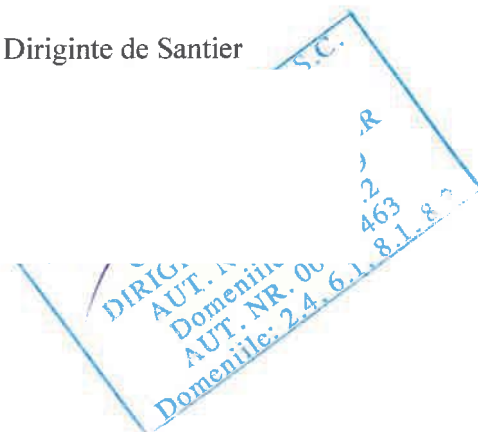

**DENUMIREA PROIECTULUI:**

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

INSPECTOR DE SANTIER:

Reabilitare sistem rufier pe DJ 153D, sector km 1+000 - 4+500

Consiliul Județean Harghita

S.C. MULTIPLAND S.R.L.

ing. Fecske Gyula

**CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	2			4			Total p01+p02+p03
		Valoarea inițială contract	Valoarea plata 01 Lei	Valoarea plata 02 Lei	Valoarea plata 03 Lei	5	6	
		1						
1.1	Sopatura ptr amenajare ampiza - 153.00 smc	225,717.16	10,097.59				10,097.59	
1.2	Completeare platforma indepartare vegetatie din zona - 78.80 smp	26,528.99					0.00	
1.3	Completeare platforma trepte infratite - 15.80 smc	47,860.60					0.00	
1.4	Completeare platforma umplutura din pamant - 92.50 smc	62,213.45					0.00	
1.5	Finisare taluz drum - 21.00 smp	14,354.31					0.00	
2.1	Pregătire platforma - 28890.00 mp	101,253.42					0.00	
2.2	Strat de forma din pamant stabilizat - 2890.00 mc	422,380.23					0.00	
2.3	Material geotextil cu rol anticonaminant - 28890.00 mp	235,526.00					0.00	
2.4	Strat din balast - 6970.00 mc	577,972.43					0.00	
2.5	Strat din piatra sparta - 3940.00 mc	559,135.22					0.00	
2.6	Strat de legatura din BAD 22.4 leg 50/70 - 3550.80 to	1,194,165.91					0.00	
2.7	Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 - 22880.00 mp	828,336.51					0.00	
2.8	Curatare si amorsare cu emulsie - 228.80 smp	41,939.58					0.00	
3.1	Refacere profil acostamente - 8.50 smp	2,351.22					0.00	
3.2	Acostamente consolidate cu percu din beton - 8.50 smp	79,731.30					0.00	
4.1	Santuri noi pereate - 3675.00 ml	688,356.39					0.00	
4.2	Rigola carosabila - 1720.00 m	1,081,027.54					0.00	
5.1	Montare borduri 20x25 cm - 1055 m	100,040.47					0.00	
5.2	Montare borduri tesite - 14 trecei	9,245.42					0.00	
5.3	Fundatii din balast pentru trotuar - 1319 mp	53,246.16					0.00	
5.4	Fundatii din balast pentru trotuar - 1319 mp	29,311.77					0.00	
5.5	Strat din nisip fundatie trotuar - 1319 mp	6,773.76					0.00	
5.6	Povele autoblocaante - 1319 mp	112,050.72					0.00	
6.1	Podet dalat la dr laterale L= 8 m - 8 buc	44,215.89					0.00	
6.2	Podet dalat la dr laterale L= 12 m - 4 buc	35,579.43					0.00	

6.3	Podet casetat (6P2+CP2+CP2) L= 8.40 m - 7 buc	374,043.89	141,942.81	98,486.28	240,429.09
6.4	Podet casetat 5C2 - 3 buc	253,889.93			0.00
6.5	Podet dalat D5 - 1 buc	223,578.58			0.00
7.1	Zid de sprijin cu fundatie directa H=(1.50 - 4.00 m) - 50 m	181,508.29		125,473.05	125,473.05
8.1	Amenajare platforma drum - 3.90 smc	1,227.22			0.00
8.2	Strat din balast - 302.4 mc	25,075.88			0.00
8.3	Strat de baza din BAD 22.40 leg 50/70 - 234 to	78,696.30			0.00
8.4	Strat de uzura din beton asfaltic Ba 16 rul 50/70 - 1.680,00 mp	60,821.91			0.00
8.5	Curatare si amorsare cu emulsie - 1.680 smp	3,079.48			0.00
8.6	Sonturi noi nepereate	10,436.39			0.00
9.1	Dezafectare betoane - 150 mc	8,095.85		3,184.76	3,184.76
9.2	Ridicare la cota camine - 15 buc	7,205.13			0.00
9.3	Relocare stalpi	153,014.40			0.00
9.4	Relocare/protejare retele(apa)	71,280.00	23,760.00		23,760.00
10.1	Semnalizare rutiera in timpul executiei - 11 pct	21,488.30		11,720.89	11,720.89
10.2	Semnalizare rutiera in timpul executiei - 3,5 km	18,608.90			0.00
10.3	Montat indicatoare rutiere - 115 buc	31,188.60			0.00
10.4	Parapet elastic - 960 ml	148,004.40			0.00
10.5	Borne hectometrice - 32 buc	536.91			0.00
10.6	Borne kilometrice - 4 buc	12,978.03			0.00
7	<b>TOTAL</b>	8,264,072.27	175,800.40	238,864.98	414,665.38

TOTAL valoare (fără TVA)  
TVA  
Total valoare (inclusiv TVA)

8,264,072.27  
175,800.40  
33,402.08  
209,202.48  
238,864.98  
45,384.35  
284,249.32  
414,665.38  
78,786.42  
493,451.80

*Verificat Aerobob  
Conform calculatilor aerobob  
de la dirigiutele de santier*



Executant
