

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 10.12.2020 Nr.: 3579

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

## PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI CHELTUIELI

Explicatie: PLATA SITUATIE DE LUCRARI NR. 3 ?I NR. 4 REABILITARE DJ 153D KM 1+000 - 4+500

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Credite bugetare aprobate (ct. 8060)	Credite bugetare angajate (ct. 8066)	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata			Disponibil de credite ramas de angajat
				valuta	curs	suma lei	
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	felul	suma	valutar	8 = col. 3-7
0				4	5	6	7
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01		0,00		1.512.332,19
Total:							1.512.332,19

Total: 1.512.332,19

Control financiar preventiv propriu

Serviciul contabilitate \*)

Compartimentul de specialitate

Semnatura

Data:

Bun de plata

Data:

Semnatura

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1, 2 si 3

## ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL / GLOBAL

Beneficiar: MULTIPLAND SRL

- lei -

Inregistrarea bugetara				Suma
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Titlu	Art. Alin.	
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	1.512.332,19

Total: 1.512.332,19

Tipul angajamentului: individual

Control financiar preventiv propriu

- Viza

Data:

- Refuz de viza

Semnatura:

- Inregistrare individuala

Nr.:

Data:

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

ROMANIA

Jud. Harghita, Loc. Miercurea Ciuc

JUDETUL HARGHITA

4245763

Data emiterii: 10.12.2020 Nr.: 4869

Compartimentul de specialitate:

Directia Generala Tehnica

Inregistrare: /

## ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: PLATĂ SITUAȚIE DE LUCRĂRI NR. 3 ȘI NR. 4 REABILITARE DJ 153D KM 1+000 - 4+500

### Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 1283/31.10.2020 , Nr.Fact. 1258/30.09.2020

Angajamentul legal: Contract de lucrari / 21653 / 23.09.2019

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 1.512.332,19

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 720.298,65

Suma de plata (valuta): - felul valutei  
- suma in valuta 0,00  
- cursul valutar  
- suma in lei 720.298,65

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

Inregistrarea bugetara				Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
Cap. Subcap.	Centr. Bugetar	Tidul	Art. Alin.			
	0			1	2	3 = col.1-2
84.02.03.01	DRUMPOD	71	71.01.01	17.240.185,70	720.298,65	16.519.887,05

### Beneficiar:

- numele: MULTIPLAND SRL
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca): Trezorerie operativa Municipiul Miercurea Ciuc

Compartimentul de specialitate

Compartimentul de contabilitate \*)

Control financiar preventiv propriu

Semnatura:

Numele .....

Data .....

Semnatura

Data:

Bun de plata

Ordonator de credite,

Data:

Semnatura:

\*) raspunde de datele inscrise in col. 1

C. J. Harghita nr. 23061 / 13.10.2020

**FACTURA**

Serie MUL Numar 1258

Data 30.09.2020 Scadent la 30.10.2020



- RON -

Furnizor

Client

MULTIPLAND SRL

JUDETUL HARGHITA

CIF 4245763

P-ta LIBERTATII Nr.5

\ MIERCUREA CIUC, jud. HARGHITA

Banca Trezoreria Statului

IBAN RO28 TREZ 24A8 4030 1560 101X

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	"REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 153D SECTOR KM 1+000 - 4+500". CONF. CTR. NR. 92/ 21653/ 23.09.2019		1.000	605 292.98	605 292.98	115 005.67
Emis de					605 292.98	115 005.67
Date privind expeditia						
Numele delegatului:						
C.I. seria: nr: eliberat de:						
Mijlocul de transport:						
<b>Total</b>						<b>720 298.65</b>





**MULTIPLAND S.R.L.**  
Construcții Drumuri și Poduri



**Sediu social:** 535600 - Odorheiu Secuiesc, str. Buzvăr, nr. 35, jud. Harghita  
Tel: 0040-266-218011, Fax: 0040-266-217409, e-mail: office@multipland.ro  
**Cod de înreg. fiscală:** RO6178970, **Nr.ord.Reg.Comertului/An:** J19/778/1994

# Reabilitare sistem rutier DJ 153D, sector km 1+000 - 4+500

---

Nr. Contract : 92 / 21653 / 23.09.2019

## **SITUATIA DE LUCRARI Nr. 3**

---

**SEPTEMBRIE 2020**

## Referatul dirigintelui de santier

Obiect ;

**Reabilitare sistem rutier pe DJ 153D, sector km 1+000 - 4+500**

Beneficiar ; Consiliul Judetean Harghita

Executant ; SC. MULTIPLAND SRL

Subiect; Lucrarile executate in perioada septembrie 2020

La verificarea lucrarilor pe teren s-a constatat corelarea cantitatilor executate cu cele din situatia de lucrari prezentata – si cu proiectul de executie


- situatia de lucrari nr, 3 in valoare de – **605.292,98 lei** fara TVA

Au fost prezentate certificatele de calitate al materialelor utilizate .

S-au incheiat procese verbale cf. programul de control .

Lucrarile au fost acceptate calitativ si cantitativ.

Diriginte de Santier

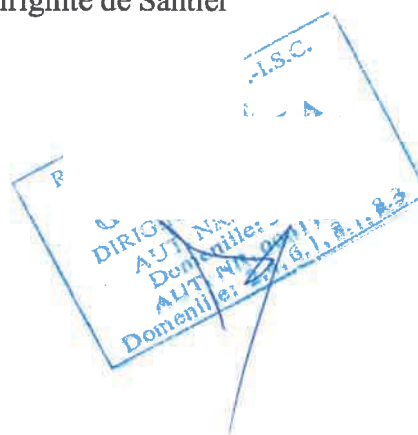

**DENUMIREA PROIECTULUI:**

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

**BENEFICIAR:****CONSTRUCTOR:****INSPECTOR DE SANTIER:**

Reabilitare sistem rufier pe DJ 153D, sector km 1+000 - 4+500

Consiliul Județean Harghita

S.C. MULTIPLAND S.R.L.

ing. Fecske Gyula

**CENTRALIZATORUL  
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea inițială contract	4				Total p01+p02+p03
			Valoarea plata 01 Lei	Valoarea plata 02 Lei	Valoarea plata 03 Lei	5	
		<b>2</b>	<b>4</b>				<b>6</b>
	<b>1</b>						
1,1	Sapatura ptr amenajare ampriza - 153,00 smc	225.717,16	10.097,59			10.097,59	
1,2	Completare platforma indepartare vegetatie din zona - 78,80 smp	26.528,99				0,00	
1,3	Completare platforma trepte infiratre - 15,80 smc	47.860,60				0,00	
1,4	Completare platforma umplutura din pamant - 92,50 smc	62.213,45				0,00	
1,5	Finisare taluz drum - 21,00 smp	14.354,31				0,00	
2,1	Pregatire platforma - 28890,00 mp	101.253,42				0,00	
2,2	Strat de forma din pamant stabilizat - 2890,00 mc	422.380,23				0,00	
2,3	Material geotextil cu rol anticonaminant - 28890,00 mp	235.526,00				0,00	
2,4	Strat din balast - 6970,00 mc	577.972,43				0,00	
2,5	Strat din piatra sparta - 3940,00 mc	559.135,22				0,00	
2,6	Strat de legatura din BAD 22,4 leg 50/70 - 3550,80 to	1.194.165,91				0,00	
2,7	Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 - 22880,00 mp	828.336,51				0,00	
2,8	Curatare si amosare cu emulsie - 228,80 smp	41.939,58				0,00	
3,1	Refacere profil acostamente - 8,50 smp	2.351,22				0,00	
3,2	Acostamente consolidate cu percu din beton - 8,50 smp	79.731,30				0,00	
4,1	Santuri noi perete - 3675,00 ml	688.356,39				0,00	
4,2	Rigola carosabila - 1720,00 m	1.081.027,54				239.906,18	
5,1	Montare borduri 20x25 cm - 1055 m	100.040,47				0,00	
5,2	Montare borduri tesite - 14 treceri	9.245,42				0,00	
5,3	Fundatie din balast pentru trotuar - 1319 mp	53.246,16				0,00	
5,4	Fundatie din balast pentru trotuar - 1319 mp	29.311,77				0,00	
5,5	Strat din nisip fundatie trotuar - 1319 mp	6.773,76				0,00	
5,6	Pavele autoblocante - 1319 mp	112.050,72				0,00	
6,1	Podet datat la dir laterale L= 8 m - 8 buc	44.215,89				0,00	

6,2	Podet dlatat la dr laterale L= 12 m - 4 buc	35.579,43					0,00
6,3	Podet caselat [6P2+CP2+CP2] L= 8,40 m - 7 buc	374.043,89	141.942,81	98.486,28	84.552,50	324.981,59	
6,4	Podet caselat SC2 - 3 buc	253.889,93			253.889,93	253.889,93	
6,5	Podet dlatat D5 - 1 buc	223.578,58					0,00
7,1	Zid de sprijin cu fundatie directa H=(1,50 - 4,00 m) - 50 m	181.508,29		125.473,05		125.473,05	
8,1	Amenajare platforma chum - 3,90 smc	1.227,22					0,00
8,2	Strat din balast - 302,4 mc	25.075,88					0,00
8,3	Strat de baza din BAD 22,40 teg 50/70 - 234 to	78.696,30					0,00
8,4	Strat de uzura din beton asfaltic Ba 16 ml 50/70 - 1680,00 mp	60.821,91					0,00
8,5	Curatire si amortare cu emulsie - 16,80 smp	3.079,48					0,00
8,6	Santuri noi neperecate	10.436,39					0,00
9,1	Dezafectare betoane - 150 mc	8.095,85			3.184,37	3.184,37	
9,2	Ridicari la cota camine - 15 buc	7.205,13					0,00
9,3	Relocare stalpi	153.014,40					0,00
9,4	Relocare/protezare retele(apa)	71.280,00	23.760,00		23.760,00	47.520,00	
10,1	Semnalezare nufiera in timpul executiei - 11 pct	21.488,30		11.720,89		11.720,89	
10,2	Semnalezare nufiera in timpul executiei - 3,5 km	18.608,90					0,00
10,3	Montaj indicatoare nufiere - 115 buc	31.188,60					0,00
10,4	Parapei elastic - 960 ml	148.004,40					0,00
10,5	Borne hectometrice - 32 buc	536,91					0,00
10,6	Borne kilometrice - 4 buc	12.978,03					0,00
7	TOTAL	8.264.072,27	351.600,80	235.680,22	605.292,98	1.016.773,60	

TOTAL valoare (fără TVA)  
TVA  
Total valoare (inclusiv TVA)

8.264.072,27  
1.570.173,73  
9.834.246,00

351.600,80  
66.804,15  
418.404,95

235.680,22  
44.779,24  
280.459,47

605.292,98  
115.005,67  
720.298,65

1.016.773,60  
193.186,98  
1.209.960,59

C.J. Harghita  
Verificat  
Aprobat, cantitatilor confirmate  
pe baza cantitatilor confirmate  
de dirigintele de santier 11.1.1. - Vilbur

Executant SOCIETATEA  
LAND  
SANTIER

ROMANIA-MARTEI-SC  
DIRIGINTA DE SANTIER  
ROMANIAN-ART-SC  
DIRIGINTA DE SANTIER  
ROMANIAN-ART-SC
