

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuieli: CTR 43 POD PE DJ 137, KM 12+260, SIT. A 5-A DECONTARE ARMARE/COFRAJ ELEVATII
CULEI SI ELEVATIE ZID SPRIJIN

Lista documentelor justificative:

Nr.Fact. 10092/14.07.2020

Angajamentul legal: / /

Modul de plata: virament

Suma datorata beneficiarului: 2.607.191,35

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: 0,00

Suma de plata: 152.404,11

Suma de plata (valuta): - felul valutei
- suma in valuta 0,00
- cursul valutar
- suma in lei 152.404,11

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare:

- lei -

| Inregistrarea bugetara | | | | Disponibil inaintea efectuării plății (ct. 8066) | Suma de plata | Disponibil după efectuarea plății |
|------------------------|----------------|-------|------------|---|---------------|--------------------------------------|
| Cap. Subcap. | Centr. Bugetar | Titlu | Art. Alin. | | | |
| 0 | | | | 1 | 2 | 3 = col.1-2 |
| 84.02.03.01 | DRUMPOD | 71 | 71.01.01 | 40.117.835,47 | 152.404,11 | 39.965.431,36 |

Beneficiar:

- numele:
- adresa:
- cod fiscal:
- numarul de cont:
- trezoreria (banca):

Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate *) Control financiar preventiv propriu

Data: _____

Semnatura: _____



Str. Șelimbărilor nr.155, cod poștal 555300, CISNĂDIE, jud. Sibiu
Tel: 0269 564 846 Fax : 0269 564 846
E-mail: office@prodial.ro
J32/1541/1994 C.U.I. RO 6442346
Cod IBAN RO57BSEA0160000001741299
CREDIT AGRICOLE BANK



SR EN ISO 9001:2015
SR EN ISO 14001:2015

Nr. 15259/14.07.2020

Nr. 326 /14.07.2020

Catre,

JUDETUL HARGHITA

Piata Libertatii, nr. 5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania

In atentia domnilor :

Referinta: "Pod peste raul Tarnava Mare pe DJ137, km 12+260, satul Porumbenii Mari,
Porumbeni Mari, judetul Harghita" (proiectare si executie)"

Atasat prezentei, va inaintam Factura nr. 10092/14.07.2020 aferenta **Situatiei de lucrari nr. 5**.

Va multumim.

Cu stima,
S.C. PRODIAL S.R.L.





RO- 555300 CISNĂDIE, str. SELIMBĂRULUI nr. 155

FACTURĂ FISCALĂ

| | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| SC PRODIAL SRL | | Cumpărător : |
| O.R.C. : J32/1541/1994 | Numar : 10092 | CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA |
| C.U.I. : RO6442346 | Serie : SB PRD | O.R.C.: |
| Capital : 20.680 | Data : 2020-07-14 | CUI : 4245763 |
| Județul : SIBIU | Aviz : | Sediul : P-TA LIBERTATII NR.5 |
| Sediul : CISNADIE, STR.SELIMBARULUI NR.155 | | Județul : HR |
| IBAN : RO72TREZ5765069XXX009952 | | Localitatea : MIERCUREA CIUC |
| Banca : TREZORERIA ,SIBIU | | IBAN : |
| IBAN RO46BTRLRONCRT0074321102 | | Banca : |
| Banca BTRL | | |

Cota TVA : 19.00 % **Nu se aplica sistemul TVA LA INCASARE**

| Nr. Crt. | Denumirea Produselor sau Serviciilor | U.M. | Cantitatea | Pretul (fără TVA) | Valoarea (fără TVA) | Valoarea TVA |
|----------|---|------|------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 1 | C/V CONF. CONTR.43/11883/25.05.2018 SI SITUATIE LUCRARI ANEXA | | 1,00 | 128.070,68 | 128.070,68 | 24.333,43 |

Data scadentei : conform contract

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura, cf art.319 alin. 29 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal | Date Privind Expediția | Total : 128.070,68 24.333,43 |
| Delegat : | C.I. : | Total de Plată : 152.404,11 |
| Auto : | Expedierea s a efectuat în Prezența noastră la data : | Semnătura de Primire : |

Executant: SC.PRODIAL SRL.
 Contract: nr. 43/11883/25.05.2018
 Beneficiar: Consiliul Judetean Harghita
 Diriginte de Santier: S.C. ATUPROFESSING SRL.
 Obiectiv : "Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni"
 Perioada: 16.05.2020 - 05.07.2020

**CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR
 PE OBIECTIV
 LUNA Iunie 2020**

| Nr. Crt. | Denumirea capitolelor de cheltuieli | Valoarea inițială contract [Lei] | Valoare plata 01 [Lei] | Valoare plata 02 [Lei] | Valoare plata 03 [Lei] | Valoare plata 04 [Lei] | Valoare plata 05 [Lei] | Total Plata p01+p02+p...[Lei] |
|----------|---|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | "Pod peste Tarnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, comuna Porumbeni" | 3,242,491.70 | 330,131.61 | 263,740.76 | 230,317.45 | 230,367.84 | 128,070.68 | 1,054,557.66 |
| 1 | Demolare pod existent | 330,131.61 | 330,131.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,131.61 |
| 2 | Infrastructura | 687,481.38 | 0.00 | 163,461.64 | 163,461.64 | 144,222.05 | 80,163.60 | 551,308.93 |
| 3 | Suprastructura | 1,139,910.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Racordari cu terasamentele | 1,041,814.76 | 0.00 | 100,279.12 | 66,855.81 | 67,715.47 | 47,907.08 | 282,757.48 |
| 5 | Amenajare albie | 9,520.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Organizare de santier | 33,633.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,430.32 | 0.00 | 18,430.32 |
| | Total General fara TVA. | 3,242,491.70 | 330,131.61 | 263,740.76 | 230,317.45 | 230,367.84 | 128,070.68 | 1,182,628.34 |
| | TVA 19 % | 616,073.42 | 62,725.01 | 50,110.74 | 43,760.31 | 43,769.89 | 24,333.43 | 224,699.38 |
| | Total General inclusiv TVA. | 3,858,565.12 | 392,856.62 | 313,851.50 | 274,077.76 | 274,137.73 | 152,404.11 | 1,407,327.72 |

ROMANIA - M.D.R. I.P.D.
 Diriginte de Santier:

BENEFICIAR : CONSILIUL JUDETEAN

EXECUTANT : SC PRODIAL SRL



Raport al Dirigintelui de Șantier

Prin prezentul raport se face o descriere a lucrărilor executate și acceptate la plată în cadrul situației de lucrări numărul cinci aferentă investiției *“Pod peste râul Târnavă Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, județul Harghita”*

Pe parcursul desfășurării lucrărilor, am supravegheat modul de execuție al lucrărilor, am participat la întocmirea proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse pentru lucrările executate.


Situațiile de lucrări mai sus precizate au fost întocmite de către executantul lucrării SC PRODIAL SRL și înaintate spre verificare în cursul lunii iulie 2020. Conform obligațiilor noastre contractuale am verificat aceste situații de lucrări în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare, a caietelor de sarcini și a proiectului tehnic de execuție. În urma măsurătorilor anterioare efectuate pe teren și a verificării situației existente pe teren le-am predat către Consiliul Județean Harghita, în termenii și conform cu obligațiile contractuale.

Au fost acceptate la plată lucrări de:

- cofrare, armare și betonare culcei pe partea stângă a râului
- cofrare, armare și betonare culcei pe partea dreaptă a râului
- hidroizolarea radierului și culcei pe partea dreaptă a râului
- realizarea drenului din piatră brută pe partea dreaptă a râului
- umplutură de pământ lângă radier și la zid pe partea dreaptă a râului
- cofrare, armare și betonare elevația zidului de sprijin pe partea dreaptă a râului
- hidroizolarea elevației zidului de sprijin pe partea dreaptă a râului

Data 20.07.2020

Diriginte de șantier

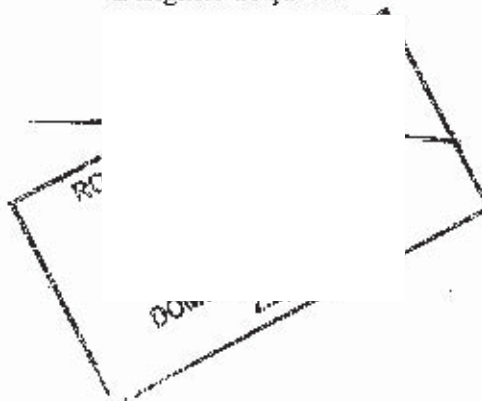

Raport de activitate proprie

Referitor la: *“Pod peste râul Târnavă Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari, județul Harghita”*

Prin prezentul raport doresc să fac un sumar al activității mele, privind lucrarea *“Pod peste râul Târnavă Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbeni Mari, județul Harghita*

Conform obligațiilor contractuale, am desfășurat următoarele activități privind proiectul la care am făcut mai sus referire:

În perioada de pregătire a investiției

1. Am verificat existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate al acesteia.
2. Am verificat concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului.
3. Am studiat proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor.
4. Am verificat existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora.
5. Am verificat respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați.
6. Am verificat existența în proiect a programelor de fază determinante și le-am depus împreună cu proiectanții de specialitate la ISC în vederea vizării.
7. Am preluat amplasamentul și reperele de nivelment și le-am predat executantului prin întocmirea Procesului Verbal de Predare Amplasament
8. Am solicitat executantului să efectueze trasarea generală a lucrării în vederea stabilirea bornelor de reper.
9. Am solicitat executantului lucrării „Planul calității” și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru această lucrare pentru a putea fi verificate.

10. Am verificat existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la IIC/ICB.

11. Am solicitat executantului lucrării să afișeze la loc vizibil panoul de identificare a investiției conform prevederilor legale.

În perioada de executare a lucrărilor

1. Am urmărit realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. Am verificat existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. Am interzis utilizarea de procedee și echipamente noi, neaccreditate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
4. Am verificat respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
5. Am verificat respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
6. Am efectuat verificările prevăzute în reglementările tehnice, am semnat și am ștampilat documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc;
7. Am transmis către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
8. Am informat operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, am propus oprirea lucrărilor;
9. Am urmărit respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

Data: 20.07.2020.

Cu stimă
DIRIGENTUL DE SERVICIU
S.C. S.C. S.C.
